

Rencana v3.0 Studio

Semua yang disepakati jadi satu: warna, font, ikon dan logo baru, robot Bata di notch, editor acara & pengingat yang dibangun ulang, dan CLI di dalam panel. Dijalankan per run dengan workflow **build**.

FASE 0
Persiapan
Rust, baseline

FASE 1
Fondasi
Warna, logo, font, ikon

FASE 2
Tampilan
Notch, panel, pengaturan

FASE 3
Editor
Acara & pengingat

FASE 4
CLI
Di dalam panel

FASE 5
Robot
Bata di notch

FASE 6
Penutup
Teks, screenshot, 3.0.0

Apa yang berubah



Warna & font

Espresso, krem, terakota. Fraunces Italic, DM Sans, DM Mono.

~~Hitam iOS + Segoe UI~~ → Studio



Logo Bata

Tile terakota dengan island espresso dan titik krem.

~~Tile gelap, titik biru~~ → Bata



Robot Bata

Logo yang punya mata; 10 ekspresi; hanya di notch.

~~Tidak ada~~ → Asisten di notch



Panel & notch

Tujuh halaman, semua status notch, ikon sendiri.

~~Segoe Fluent, iOS~~ → Gaya Studio



Editor acara & pengingat

Chip + popover kalender dan jam, tanpa kontrol Windows.

~~Kalender Win32, teks pelangi~~ → Digambar sendiri



CLI

Terminal langsung di halaman panel, status di notch.

~~Jendela popup~~ → Di dalam panel

PETA JALAN

Sebelas langkah, berurutan

FASE 0	F0	**Persiapan** Pasang Rust, commit desain, baseline test	kecil	Manual, bukan workflow
FASE 1	1	**Run 1 · Warna Studio + logo Bata** theme.rs, ikon app & tray	kecil	Setelah F0
FASE 1	2	**Run 2 · Font tertanam** Fraunces, DM Sans, DM Mono	sedang	Setelah Run 1 (boleh tukar dengan Run 3)
FASE 1	3	**Run 3 · Set ikon sendiri** Ganti Segoe Fluent	sedang	Setelah Run 1
FASE 2	4	**Run 4 · Restyle notch, panel, pengaturan** 6 halaman panel + Settings	besar	Setelah Run 1–3
FASE 3	5	**Run 5 · Kerangka editor + editor acara** Tanpa kontrol tanggal Windows	besar	Setelah Run 4
FASE 3	6	**Run 6 · Editor pengingat** Pakai kerangka Run 5	sedang	Setelah Run 5
FASE 3	6b	**Run 6b · Mingguan pilih hari + pintasan** Fitur baru, data pengingat	sedang	Opsional, setelah Run 6
FASE 4	7	**Run 7 · CLI di dalam panel** Fokus keyboard, hapus jendela CLI	besar	Setelah Run 4
FASE 5	8	**Run 8 · Robot Bata di notch** Ekspresi, animasi, pengaturan	besar	Setelah Run 7
FASE 6	9	**Run 9 · Teks, screenshot, versi 3.0.0** i18n, README, memori	kecil	Terakhir

Satu run = satu kali workflow **build** (Plan → Build → Review → Check → Ship ke `main`). Run berikutnya dimulai setelah run sebelumnya hijau dan ter-push. Ukuran: kecil ≈ 1 task, besar = beberapa task paralel.

F0 *Persiapan*

kecil

- Pasang Rust: `winget install Rustlang.Rustup`, toolchain stable, VS Build Tools (C++).
- `cargo test --locked` hijau di `main`.
- Commit `docs/design/` dan rencana ini.

Selesai kalau: `cargo` jalan dan semua test hijau.

1 *Run 1 · Warna Studio + logo Bata*

kecil

`src/theme.rs` `assets/logo.svg` `scripts/make-icon.ps1` `assets/icon.ico` `src/ui/app_icon.rs`

- Aksen: Terracotta, Sage, Ochre, Clay, Olive, Plum. Island: Espresso / Graphite.
- Palet jendela terang & gelap Studio.
- Alias nama lama (Blue→Terracotta, dst.) agar config lama aman.
- Logo Bata + regenerasi ikon.

Selesai kalau: test kontras lulus; ikon tray 16 px terbaca.

```
build › Ganti palet ke Studio dan logo ke Bata
sesuai rencana v3-studio Run 1.
```



Token warna, font, radius, ikon

2 *Run 2 · Font tertanam*

sedang

`assets/fonts/` `render.rs` `render_panel.rs` `settings_controls.rs`

- Subset Latin + OFL.txt.
- DirectWrite in-memory font collection; GDI via AddFontMemResourceEx.
- Fallback ke Segoe UI kalau gagal.

Selesai kalau: exe naik ≤ 400 KB; screenshot demo memakai font baru.

```
build › Tanam font Fraunces, DM Sans dan DM Mono
sesuai rencana v3-studio Run 2.
```

3 *Run 3 · Set ikon sendiri*


sedang

`src/ui/icons.rs (baru)` `shortcuts.rs` `render.rs` `settings_controls.rs`

- Path 24-grid dari `icon()` di studio-ui.html sebagai ID2D1PathGeometry.
- Garis 1,5, ujung bulat, isian aksen 38%.

Selesai kalau: tidak ada lagi Segoe Fluent / MDL2.

```
build › Ganti semua ikon Segoe Fluent dengan set
ikon Studio sesuai rencana v3-studio Run 3.
```

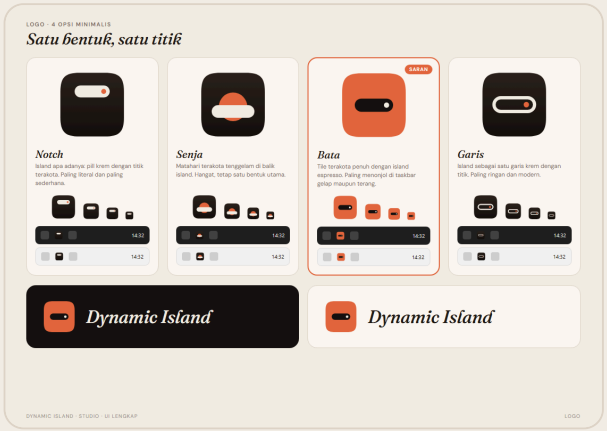

Logo Bata (dipilih)

4 *Run 4 · Restyle notch, panel, pengaturan*


besar

`render.rs` `geometry.rs` `render_panel.rs` `panel_layout.rs` `settings.rs` `settings_layout.rs` `settings_controls.rs`


- Notch: jam Fraunces It, cincin Pomodoro kecil, musik, lirik, notice badge 40 px.
- Kalender Bulan / Minggu / Hari (garis "sekarang").
- Pomodoro: cincin besar, satu tombol utama.
- Pengingat: kelompok Hari ini / Besok, tag "Terlewat", ikon ulang.
- Catatan: kartu 2 kolom.
- Musik: sampul besar, tombol Lirik. Shortcuts: tile radius 18.
- Pengaturan: sidebar, kartu, segmen, toggle, stepper, 6 swatch aksen.
- Radius: panel 30, tile 18, kartu 14, kontrol 10.

Selesai kalau: screenshot `demo.rs` tiap halaman cocok dengan studio-ui.pdf hal. 3–12; test state & panel tetap hijau.

```
build › Restyle notch, ketujuh halaman panel (kecuali CLI) dan jendela pengaturan ke Studio sesuai rencana v3-studio Run 4.
```




Status notch



Kalender




Hari & Pomodoro



Pengingat & Catatan



Musik



Pengaturan

5 Run 5 · Kerangka editor + editor acara

besar

`src/ui/editor.rs` `i18n.rs`

- Jendela tanpa bingkai; header, chip, toggle, segmen digambar Direct2D. Teks tetap `EDIT`.
- Hapus DATETIMEPICK, `paint_themed`, `tone`.
- Popover kalender (grid panel) dan jam per 15 mnt.
- Validasi jam; Simpan nonaktif tanpa judul; format tanggal dari i18n.
- Keyboard lengkap; editor catatan ikut.

Selesai kalau: tidak ada teks pelangi atau "10/26/2026".

```
build › Bangun ulang editor acara sesuai rencana v3-studio Run 5 dan editor-acara.pdf.
```

6 Run 6 · Editor pengingat

sedang

`src/ui/editor.rs`

- Teks besar, chip tanggal & jam, segmen Sekali/Harian/Mingguan.
- Kalimat ringkasan; Hapus hanya saat edit.
- Tanggal lewat diredupkan.

Selesai kalau: pengingat lama tetap bisa dibuka & disimpan.

```
build › Bangun ulang editor pengingat sesuai rencana v3-studio Run 6.
```

6b Run 6b · Mingguan pilih hari + pintasan


sedang

`src/reminders.rs` `src/ui/editor.rs`

- Mingguan: beberapa hari (S S R K J S M).
- Field hari opsional di reminders.json; data lama tetap terbaca.
- Pintasan: 30 mnt lagi, 1 jam lagi, nanti malam, besok pagi.

Selesai kalau: test file lama & baru, jadwal multi-hari, DST.

```
build › Tambah pilihan beberapa hari dan pintasan waktu sesuai rencana v3-studio Run 6b.
```

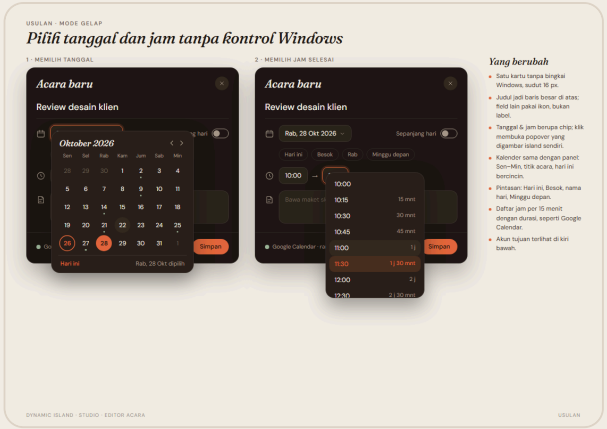

Editor acara



Editor pengingat

7 *Run 7 · CLI di dalam panel*


besar

`src/ui/window.rs` `src/state.rs` `render_panel.rs` `panel_layout.rs` `src/app.rs`
`src/ui/cli_window.rs (dihapus)`

- Island boleh aktif selama input CLI dipakai (sekarang `WS_EX_NOACTIVATE`); dilepas saat Esc / klik di luar.
- Panel tidak menutup saat mouse keluar selama input aktif.
- Input: satu `EDIT` tersembunyi (IME, paste, undo) digambar di panel. Enter, ↑↓, Tab, Ctrl+C, Esc.
- Output DM Mono mengalir dari bawah; roda mouse di output menggulir output, bukan pindah halaman.
- Chip: folder, shell, "Berjalan · 0:42" + Stop, hasil sage / "exit 1" merah lembut.
- Saran riwayat di atas input; `cd` & `cls` tetap.
- Tombol perbesar 560 × 440.
- Perintah tetap jalan saat panel ditutup; status di notch (berjalan, selesai 5 dtk, gagal sampai diklik).

Selesai kalau: tidak ada jendela CLI lagi; test kunci panel & scroll; perintah bertahan saat panel ditutup.

```
build › Pindahkan CLI ke dalam halaman panel dan hapus jendela CLI sesuai rencana v3-studio Run 7 dan pengingat-cli.pdf.
```

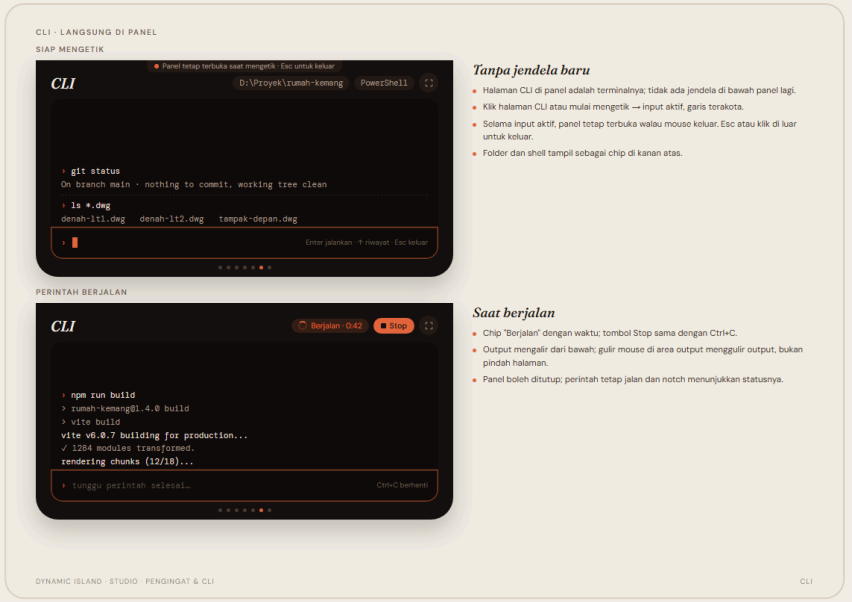

CLI siap & berjalan



Panel besar & status di notch

8 *Run 8 · Robot Bata di notch*

besar

`src/ui/robot.rs (baru)` `render.rs` `geometry.rs` `frame_clock.rs` `config.rs` `settings_layout.rs` `i18n.rs`


- Kepala 52×46 r18 terakota, visor 40×22 r11 espresso, mata krem. Tanpa telinga & antena.
- Kedip + 10 ekspresi; ukuran 20–48 px.
- Muncul di jam kosong, Pomodoro, musik, lirik, pengingat, fase selesai, Claude, baterai, status CLI. Tidak untuk notifikasi aplikasi lain.
- Animasi: kedip acak 4–7 dtk, hover senang, waspada memantul 2×, tidur setelah N menit. Mode Hemat tanpa gerak.
- Sapaan pagi sekali sehari (4 dtk).
- Pengaturan → Tampilan: Asisten di notch, Animasi, Tidur setelah, Sapaan pagi.

Selesai kalau: idle tetap hemat; test pemilihan ekspresi & jadwal tidur; lebar notch disesuaikan.

```
build › Tambahkan robot Bata di notch sesuai rencana v3-studio Run 8 dan studio-robot.pdf.
```



Ekspresi

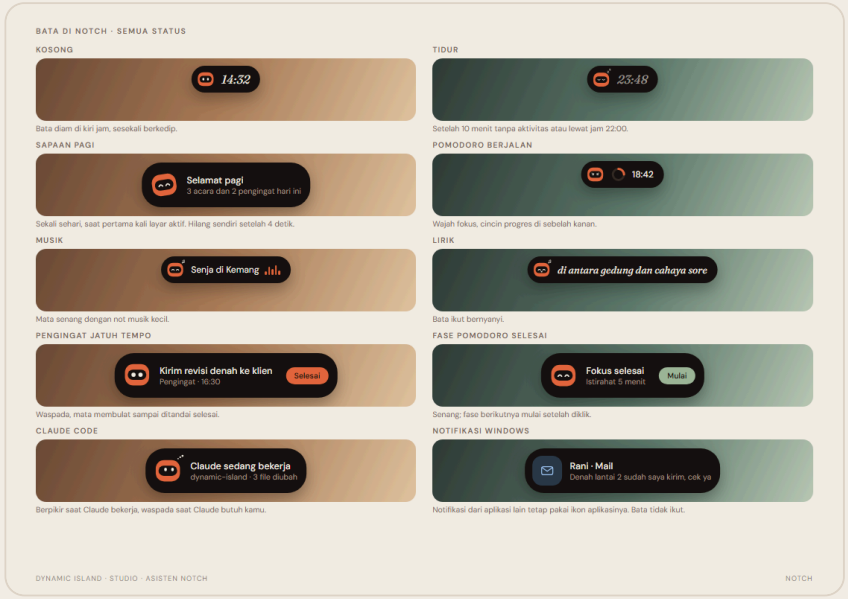

Bata di notch

9 *Run 9 · Teks, screenshot, versi 3.0.0*

kecil

`i18n.rs` `demo.rs` `README.md` `Cargo.toml` `docs/memory/`

- Semua teks baru ID/EN.
- Screenshot baru lewat demo, README & kredit font.
- Versi 3.0.0; catatan memori.
- Tag rilis `v3.0.0` oleh pemilik.

Selesai kalau: README cocok dengan app; versi 3.0.0.

```
build › Rapikan i18n, screenshot, README dan
versi 3.0.0 sesuai rencana v3-studio Run 9.
```

KEPUTUSAN TERBUKA (DEFAULT DIPAKAI KALAU TIDAK DIJAWAB)

PERTANYAAN	DEFAULT
Config lama dengan aksen Blue/Green/…	Blue→Terracotta, Green→Sage, Orange→Ochre, Pink→Clay, Purple→Plum, Red→Terracotta; Black→Espresso
Menu tray	Tetap menu Windows (ikut mode gelap); menu custom di luar cakupan
Run 6b (Mingguan pilih hari, pintasan)	Ikut, sebagai run terpisah
Robot aktif default	Ya: Animasi Penuh, tidur 10 mnt, sapaan pagi aktif

RISIKO

RISIKO	PENANGANAN
Rust belum terpasang	Fase 0 wajib dulu
Fokus keyboard island (CLI) mengganggu app lain	Fokus hanya selama input dipakai; lepas di Esc / klik luar; uji di app layar penuh
Exe membesar karena font	Subset Latin, batas 400 KB
Fraunces Italic di ukuran kecil	Hanya judul ≥ 16 px dan jam
Agen tidak bisa "melihat" UI	Check memakai screenshot `demo.rs` dibanding PDF desain

CARA MENJALANKAN

Nanti, tinggal jalan satu per satu

1
Selesaikan Fase 0
Pasang Rust dan pastikan `cargo test --locked` hijau. Commit file desain dan rencana.

2
Minta satu run
Di Claude Code: *"jalankan Run 1 dari rencana v3-studio"*. Workflow **build** memakai teks args di kartu run.

3
Cek hasilnya
Workflow merge ke `main` dan push kalau test hijau. Coba app-nya, bandingkan dengan PDF desain.

4
Lanjut run berikutnya
Ulangi sampai Run 9. Deploy dan tag rilis tetap kamu yang lakukan.

FILE RENCANA & DESAIN

`docs/superpowers/plans/2026-10-26-v3-studio.md`	Rencana lengkap untuk agen (sumber utama)
`docs/design/studio-ui.pdf`	Token, logo, notch, panel, editor, pengaturan
`docs/design/studio-robot.pdf`	Robot Bata
`docs/design/editor-acara.pdf`	Editor acara
`docs/design/pengingat-cli.pdf`	Editor pengingat & CLI di panel

SUDAH TIDAK BERLAKU

`docs/design/redesign-3.0.pdf`	Perbandingan 3 arah awal; arah Studio sudah dipilih
Logo Senja / Notch / Garis	Diganti Bata
Robot dengan telinga & antena	Diganti versi tanpa keduanya
Jendela CLI terpisah	Diganti CLI di panel
