

Rencana v3.1

Lirik yang tidak terpotong, CLI yang ikut folder, judul tegak, halaman Sistem dengan deep clean dua mode, clipboard sendiri, preview screenshot, perbaikan musik ter-pause, nama baru Vale dengan maskot kucing, dan login Google satu klik. Dijalankan per run dengan workflow **build**.

FASE 0
Persiapan
Pull, preflight

FASE 1
Tampilan
Judul, lirik

FASE 2
CLI
Ikut folder

FASE 3
Sistem
Monitor, deep clean

FASE 4
Clipboard
Riwayat, screenshot

FASE 5
Penutup
Halaman, 3.1.0


FASE 6
Tambahan
Fix musik, Vale, kucing, login

Apa yang dikerjakan



Lirik

Notch melebar 220–560 px, bergeser kalau lebih panjang.

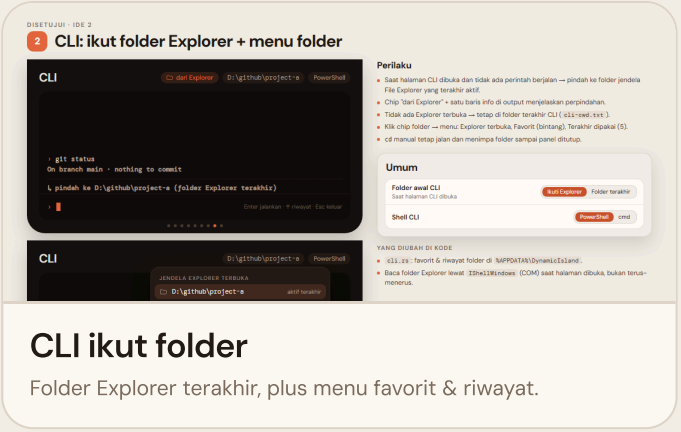

CLI ikut folder

Folder Explorer terakhir, plus menu favorit & riwayat.




Judul tegak

DM Sans 600 menggantikan Fraunces Italic.



Sistem

CPU, RAM, disk, proses teratas, peringatan di notch.



Deep clean · opsi D

Pilih sendiri (bawaan) atau Otomatis dengan Mole.



Clipboard

Riwayat 50 item di panel, privasi aman.

Ditambah: preview screenshot (Run 8), 9 halaman panel (Run 9), fix musik ter-pause (Run 11), nama Vale (Run 12), maskot kucing (Run 13), login Google satu klik (Run 14).

PETA JALAN

Lima belas langkah, dalam urutan ini

FASE 0	F0	Persiapan Pull, preflight di PC baru, baseline test	kecil	Manual, bukan workflow
FASE 6	11	Run 11 · Fix: musik ter-pause sendiri Log diagnosis + klik aman + sesi yang benar	kecil	Paling awal, setelah F0
FASE 1	1	Run 1 · Judul tegak (DM Sans 600) Fraunces dikeluarkan dari exe	sedang	Setelah F0 · duluan, menyentuh semua gambar
FASE 1	2	Run 2 · Lirik melebar 220–560 px, bergeser kalau lebih	kecil	Setelah Run 1 (boleh tukar dengan Run 3)
FASE 2	3	Run 3 · CLI ikut folder Explorer Chip + menu folder, favorit, riwayat	sedang	Setelah Run 1
FASE 3	4	Run 4 · Halaman Sistem (monitor) CPU, RAM, disk, proses, peringatan	sedang	Setelah Run 1
FASE 3	5	Run 5 · Deep clean · Pilih sendiri Mesin island, kategori, Recycle Bin	besar	Setelah Run 4
FASE 3	6	Run 6 · Deep clean · Otomatis Mole Pratinjau, konfirmasi, log, hasil diukur	besar	Setelah Run 5
FASE 4	7	Run 7 · Clipboard sendiri Riwayat 50 item, halaman panel	besar	Setelah Run 1
FASE 4	8	Run 8 · Screenshot + preview Salin lagi / Simpan / Hapus di notch	sedang	Setelah Run 7
FASE 5	9	Run 9 · Sembilan halaman + pengaturan Urutan, sembunyikan halaman	kecil	Setelah Run 4 & 7
FASE 6	12	Run 12 · Ganti nama ke Vale Exe, folder data + migrasi, installer	sedang	Setelah Run 9
FASE 6	13	Run 13 · Maskot kucing + logo bertelinga Varian B dengan pita	sedang	Setelah Run 12
FASE 6	14	Run 14 · Login Google satu klik Client bawaan, Lanjutan tetap ada	kecil	Setelah Run 13
FASE 5	10	Run 10 · Teks, screenshot, versi 3.1.0 i18n, README, kredit Mole, memori	kecil	Paling akhir (setelah Run 14)

Satu run = satu kali workflow **build** (Plan → Build → Review → Check → Ship ke `main`). Rencana lengkap untuk agen: `docs/superpowers/plans/2026-10-27-v3.1.md`.

F0 Persiapan

kecil

- `git pull`.
- PC baru: jalankan ulang preflight AGENTS.md (abaikan `.claude/preflight.done`).
- Rust stable (MSVC) + VS 2022 Build Tools (C++).
- `cargo test --locked` hijau.

Selesai kalau: build & test jalan di PC itu.

1 Run 1 · Judul tegak (DM Sans 600)

sedang

`fonts.rs` `render.rs` `render_panel.rs` `panel_layout.rs` `settings_*.rs` `editor_layout.rs` `app.rc` `make-fonts.ps1`

- Semua Fraunces Italic → DM Sans 600, rapat -2,5%.
- Termasuk jam di notch, jam Pomodoro, judul lagu, lirik.
- Hapus RCDATA 201/202, file & skrip Fraunces, kredit README.

Selesai kalau: tidak ada "Fraunces" di `src/` ; exe lebih kecil.

```
build › Ganti semua Fraunces Italic dengan DM Sans 600 sesuai Run 1 di rencana v3.1.
```

2 Run 2 · Lirik melebar


kecil

`geometry.rs` `render.rs`

- Lebar `MediaLyric` = teks + robot + padding, 220 – min(560, 45% layar).
- Animasi 180 ms; tidak menyusut < 40 px.
- Lebih panjang: diam 1 dtk lalu bergeser, ujung memudar.

Selesai kalau: test geometri; tidak ada "…" untuk baris ≤ 560 px.

```
build › Buat notch lirik melebar mengikuti panjang baris sesuai Run 2 di rencana v3.1.
```

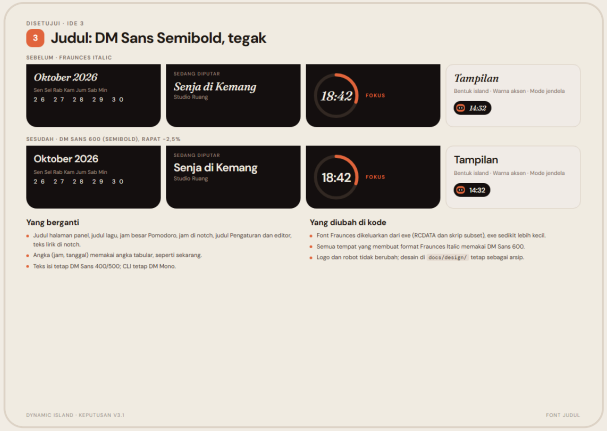

Judul tegak



Lirik melebar

3 Run 3 · CLI ikut folder Explorer

sedang

`cli.rs` `render_panel.rs` `panel_layout.rs` `app.rs` `settings_layout.rs`

- Saat halaman CLI dibuka & tidak ada perintah: folder Explorer terakhir via `IShellWindows`.
- Chip "dari Explorer" + baris info di output.
- Menu folder: Explorer terbuka, Favorit, Terakhir dipakai (5).
- Pengaturan: Folder awal CLI = Ikuti Explorer / Folder terakhir.
- Tidak mengambil foreground (lihat catatan fokus CLI).

Selesai kalau: test favorit/riwayat; tidak pindah folder di tengah perintah.

```
build › CLI pindah ke folder Explorer terakhir dan dapat menu folder sesuai Run 3 di rencana v3.1.
```

4 Run 4 · Halaman Sistem (monitor)


sedang

`src/system.rs (baru)` `model.rs` `render_panel.rs` `panel_layout.rs` `settings_layout.rs`

- CPU `GetSystemTimes`, RAM `GlobalMemoryStatusEx`, disk `GetDiskFreeSpaceExW`, 3 proses teratas.
- Halaman Sistem: cincin CPU + grafik 60 dtk, bar RAM & disk, uptime, tombol Bersihkan.
- Update 2 dtk saat terlihat; cek latar 5 mnt untuk peringatan (robot lesu).
- Pengaturan: batas disk 10 GB, RAM 90%.

Selesai kalau: tanpa redraw saat tertutup; test peringatan sekali-lewat.

```
build › Tambah halaman panel Sistem untuk CPU, RAM, disk dan proses teratas sesuai Run 4 di rencana v3.1.
```

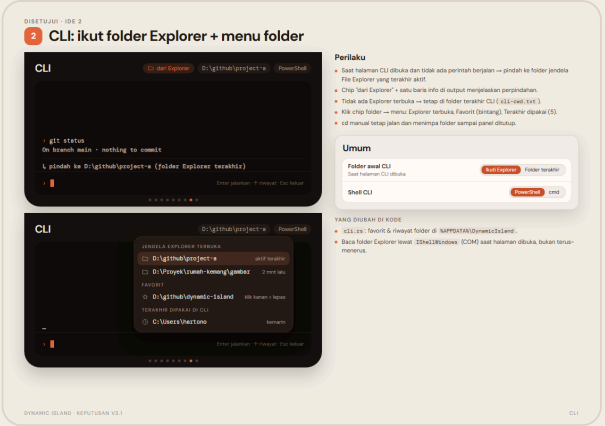

CLI ikut folder



Halaman Sistem

5 Run 5 · Deep clean · Pilih sendiri

besar

`src/clean.rs (baru)` `render_panel.rs` `panel_layout.rs` `README / NOTICE`

- 7 kategori; lokasi mengacu Mole Windows (MIT, data saja, dengan kredit).
- Pindai di latar → ukuran per kategori; centang awal 3 teratas.
- Cache dihapus permanen; file pengguna ke Recycle Bin; file terkunci dilewati.
- Kategori admin lewat proses terpisah (`runas`).
- Hasil = selisih sisa disk yang diukur island.

Selesai kalau: test lokasi & umur file; tidak ada hapus tanpa konfirmasi.

```
build › Bangun pembersih island (mode Pilih sendiri) sesuai Run 5 di rencana v3.1 dan deepclean-opsi-d.pdf.
```

6 Run 6 · Deep clean · Otomatis Mole


besar

`src/clean.rs` `render_panel.rs` `settings_layout.rs`

- Deteksi Mole (`mole.ps1` / `mo`, VERSION); belum ada → "Cara memasang".
- Selalu pratinjau `--dry-run` → 4 grup → "Yakin? Hapus permanen" → jalan.
- Log di panel tanpa ANSI; hasil diukur island; format rusak → "lihat log".
- Whitelist awal: cache Cargo & Autodesk; "+ Sistem (admin)" tidak dicentang.
- Chip Eksperimental; versi ≠ 1.30.x → peringatan.

Selesai kalau: test parser pada output nyata & rusak; tak pernah jalan tanpa pratinjau.

```
build › Tambah mode Otomatis dengan Mole di halaman Bersihkan sesuai Run 6 di rencana v3.1.
```

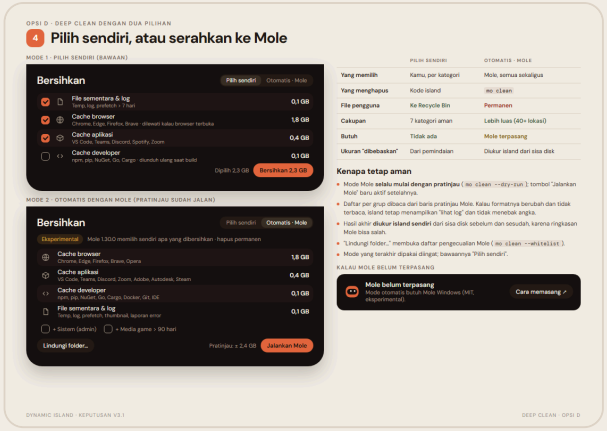

Dua mode



Alur mode Mole

7 Run 7 · Clipboard sendiri

besar

`src/clipboard.rs (baru)` `shortcuts.rs` `render_panel.rs` `panel_layout.rs` `settings_layout.rs`

- `AddClipboardFormatListener`; 50 item; teks, tautan, kode, warna, gambar, file.
- Lewati isi password manager (format exclude/history).
- Simpan terenkripsi DPAPI; opsi hanya memori.
- Halaman Clipboard: cari, sematkan, hapus, teks biasa. Tombol Shortcuts → halaman ini.
- **Tidak ada pintasan bawaan**; Ctrl+Shift+V tidak ditawarkan (bentrok "tempel teks biasa").

Selesai kalau: test jenis, batas & sematan, pengecualian, file terenkripsi.

```
build › Tambah riwayat clipboard dan halaman panel
Clipboard sesuai Run 7 di rencana v3.1.
```

8 Run 8 · Screenshot + preview


sedang

`src/app.rs` `render.rs` `shortcuts.rs` `settings_layout.rs`


- Deteksi: gambar baru di clipboard + file baru di Pictures\Screenshots; juga PrtSc & Win+Shift+S.
- Notice: thumbnail, Salin lagi / Simpan / Hapus; klik gambar = buka.
- Hapus = file + clipboard bila masih sama. Diabaikan 8 dtk → Simpan.
- Masuk riwayat Clipboard sebagai kartu gambar.

Selesai kalau: test pencocokan file ↔ clipboard; tak ada file terhapus tanpa klik.

```
build › Tambah preview screenshot di notch dengan
Salin lagi, Simpan, Hapus sesuai Run 8 di rencana
v3.1.
```

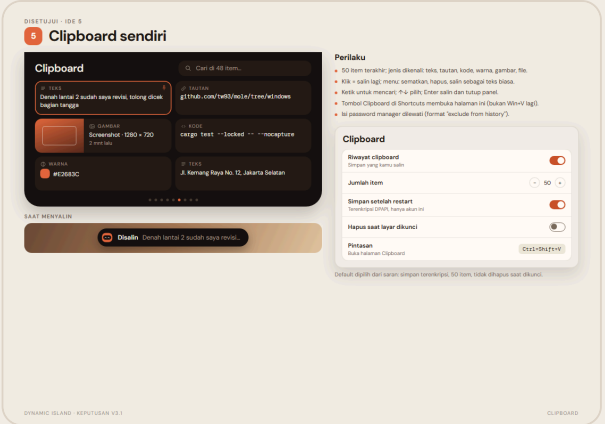

Clipboard

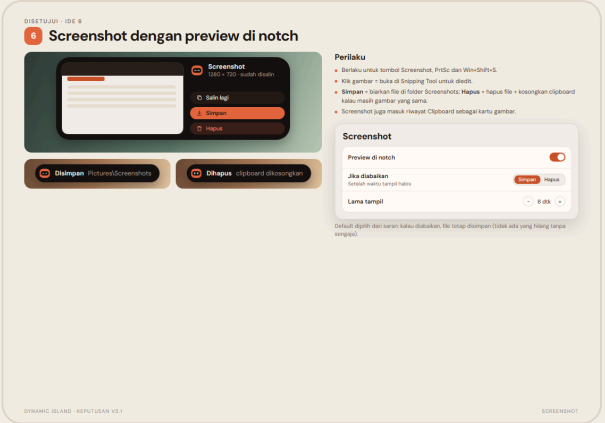

Preview screenshot

11 Run 11 · Fix: musik ter-pause sendiri

kecil

`src/app.rs` `src/state.rs` `src/sources/media.rs`

- **Temuan:** island hanya mengirim perintah media dari klik, bukan timer.
- Celah: klik dihitung dari `WM_LBUTTONUP` saja; panel bisa terbuka di bawah kursor di halaman Musik; perintah ke `GetCurrentSession()` + toggle buta.
- Kemungkinan luar: YouTube Music "Continue watching?", headset Bluetooth, app panggilan.
- Kerjakan: log diagnosis (tanpa judul lagu), klik harus tekan+lepas di island, abaikan tombol 300 ms setelah panel terbuka, kirim ke sesi yang tampil dengan Play/Pause eksplisit.

Selesai kalau: test klik tanpa tekan & klik saat panel baru terbuka; test pemilihan sesi.

```
build › Selidiki dan perbaiki musik yang kadang ter-pause sendiri sesuai Run 11 di rencana v3.1.
```

14 Run 14 · Login Google satu klik


kecil

`src/google/oauth.rs` `settings_layout.rs` `site/`


- Client ID bawaan dari satu konstanta; kosong = tombol tidak muncul.
- Integrasi: "Masuk dengan Google" utama, "Lanjutan: Client ID sendiri" tetap.
- Alur PKCE + loopback dan scope tidak berubah.
- Jalur Google: publish (B) lalu verifikasi (C) — dikerjakan pemilik.

Selesai kalau: test pemilihan client bawaan / sendiri / kosong.

```
build › Tambah tombol Masuk dengan Google memakai client bawaan sesuai Run 14 di rencana v3.1.
```

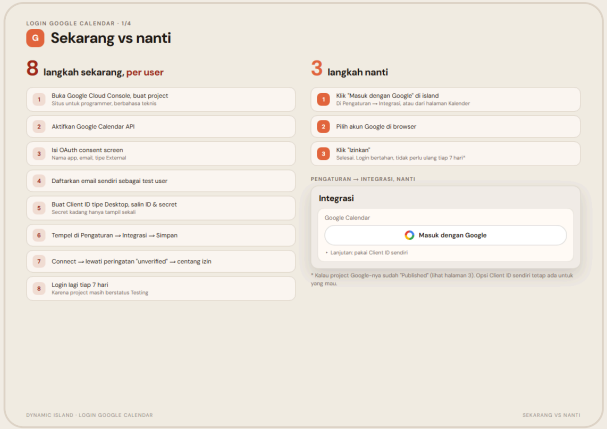

Login sekarang vs nanti

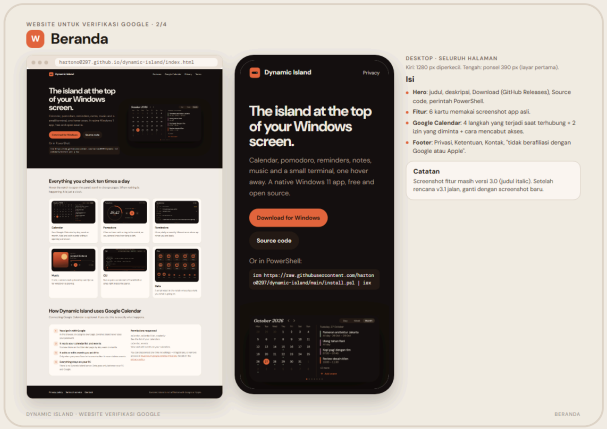

Website verifikasi (site/)

12 Run 12 · Ganti nama ke Vale

sedang

`seluruh src (nama)` `config.rs (folder data)` `install.ps1` `uninstall.ps1` `release.yml` `README` `site/`

- Nama tampilan "Vale"; exe `vale.exe`.
- Folder data `%APPDATA%\Vale` + migrasi sekali jalan dari DynamicIsland.
- Autostart, hooks Claude, mutex, installer: entri lama dibersihkan.
- ID teknis unik (bukan "Vale" polos); ganti nama repo GitHub oleh pemilik.

Selesai kalau: test migrasi folder; instal di atas versi lama membawa data.

```
build › Ganti nama app ke Vale beserta migrasi data sesuai Run 12 di rencana v3.1.
```

13 Run 13 · Maskot kucing + logo bertelinga


sedang

`src/ui/robot.rs → maskot` `assets/logo.svg` `make-icon.ps1` `icon.ico` `app_icon.rs`


- Kucing varian B: kepala bulat, telinga, mata + bulu mata, pita plum.
- Semua ekspresi dipetakan; telinga ikut ekspresi.
- Animasi & aturan tampil sama seperti Bata.
- Logo tile bertelinga di 3 sumber logo.

Selesai kalau: screenshot semua ekspresi; ikon tray 16 px terbaca.

```
build › Ganti robot Bata dengan kucing Vale (varian B, pita) dan logo tile bertelinga sesuai Run 13 di rencana v3.1.
```

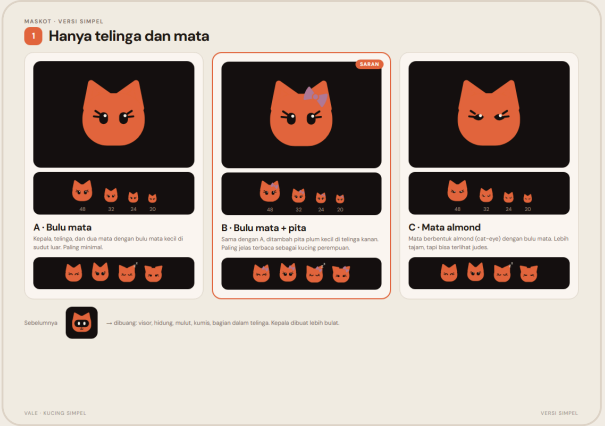

Kucing varian B (dengan pita)

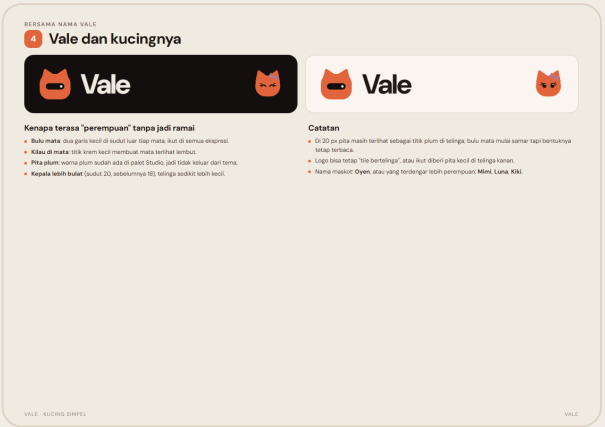

Vale + logo bertelinga

9 Run 9 · Sembilan halaman + pengaturan

kecil

`state.rs` `model.rs` `config.rs` `settings_layout.rs`

- Urutan: Kalender, Pomodoro, Pengingat, Catatan, Musik, Clipboard, Sistem, CLI, Shortcuts.
- Tampilan → Halaman panel: aktif/mati + naik/turun.
- Titik & scroll hanya halaman aktif.

Selesai kalau: test urutan & penyembunyian.

```
build › Atur urutan 9 halaman panel dan tambah pengaturan Halaman panel sesuai Run 9 di rencana v3.1.
```

10 Run 10 · Teks, screenshot, versi 3.1.0

kecil

- i18n ID/EN; screenshot baru lewat demo.
- README: fitur, kredit Mole (MIT), tanpa Fraunces.
- Versi 3.1.0; catatan memori.

Selesai kalau: README cocok dengan app.

```
build › Rapikan i18n, screenshot, README dan versi 3.1.0 sesuai Run 10 di rencana v3.1.
```

DEFAULT YANG DIPAKAI

HAL	DEFAULT
Clipboard	Simpan setelah restart (DPAPI), 50 item, tidak dihapus saat dikunci, "Disalin" hanya dari island
Pintasan Clipboard	Tidak ada; pilih sendiri di Pengaturan (bukan Ctrl+Shift+V)
Screenshot diabaikan	Simpan, tampil 8 detik
Peringatan Sistem	Disk < 10 GB, RAM > 90% selama 1 menit
Deep clean	Bawaan "Pilih sendiri"; Mole: whitelist Cargo & Autodesk, + Sistem tidak dicentang, versi lain boleh dengan peringatan
Halaman panel	Semua 9 aktif
Nama & maskot	Vale; kucing varian B (pita); logo tile bertelinga
Belum diputuskan	Nama maskot, lisensi repo, email & domain website, Client ID Google (dibuat pemilik)

RISIKO

RISIKO	PENANGANAN
Output Mole berubah / salah	Parse per baris, hasil diukur island, fallback "lihat log"
Data penting terhapus	Pratinjau + konfirmasi; Recycle Bin untuk file pengguna; whitelist di mode Mole
Clipboard menyimpan rahasia	Lewati format password manager; DPAPI; opsi hanya memori
Monitor boros daya	Redraw hanya saat halaman Sistem terlihat
Langkah admin	Proses terpisah via UAC, bukan seluruh app

CARA MENJALANKAN

Lanjut di PC mana pun

1
Fase 0
`git pull`, preflight ulang kalau PC baru, Rust + Build Tools, `cargo test --locked` hijau.

2
Minta satu run
"jalankan Run 11 dari rencana v3.1", atau *"jalankan semua run sesuai urutan di rencana"* (Run 11 duluan, Run 10 terakhir).

3
Cek hasilnya
Workflow merge ke `main` dan push kalau hijau. Bandingkan dengan PDF desain.

4
Selesai
Memori Obsidian diperbarui di Run 10. Tag rilis `v3.1.0` kamu yang buat.

FILE

`docs/superpowers/plans/2026-10-27-v3.1.md`	Rencana lengkap untuk agen (sumber utama)
`docs/design/keputusan-v3.1.pdf`	Mockup final + analisis Mole
`docs/design/deepclean-opsi-d.pdf`	Deep clean dua mode
`docs/design/brainstorm-v3.1.pdf`	Semua pilihan awal (arsip)

YANG TIDAK DIPAKAI

Fraunces Italic	Diganti DM Sans 600
Mole sebagai satu-satunya mesin (opsi B)	Diganti opsi D, dua mode
Ctrl+Shift+V untuk Clipboard	Bentrok dengan "tempel teks biasa"
Win+V untuk tombol Clipboard	Diganti halaman Clipboard
